


TABLERO DE CONTROL | ALERTAS

Conectividad en escuelas y unidades de gestión en Paraguay
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC



Avance financiero de todo el proyecto


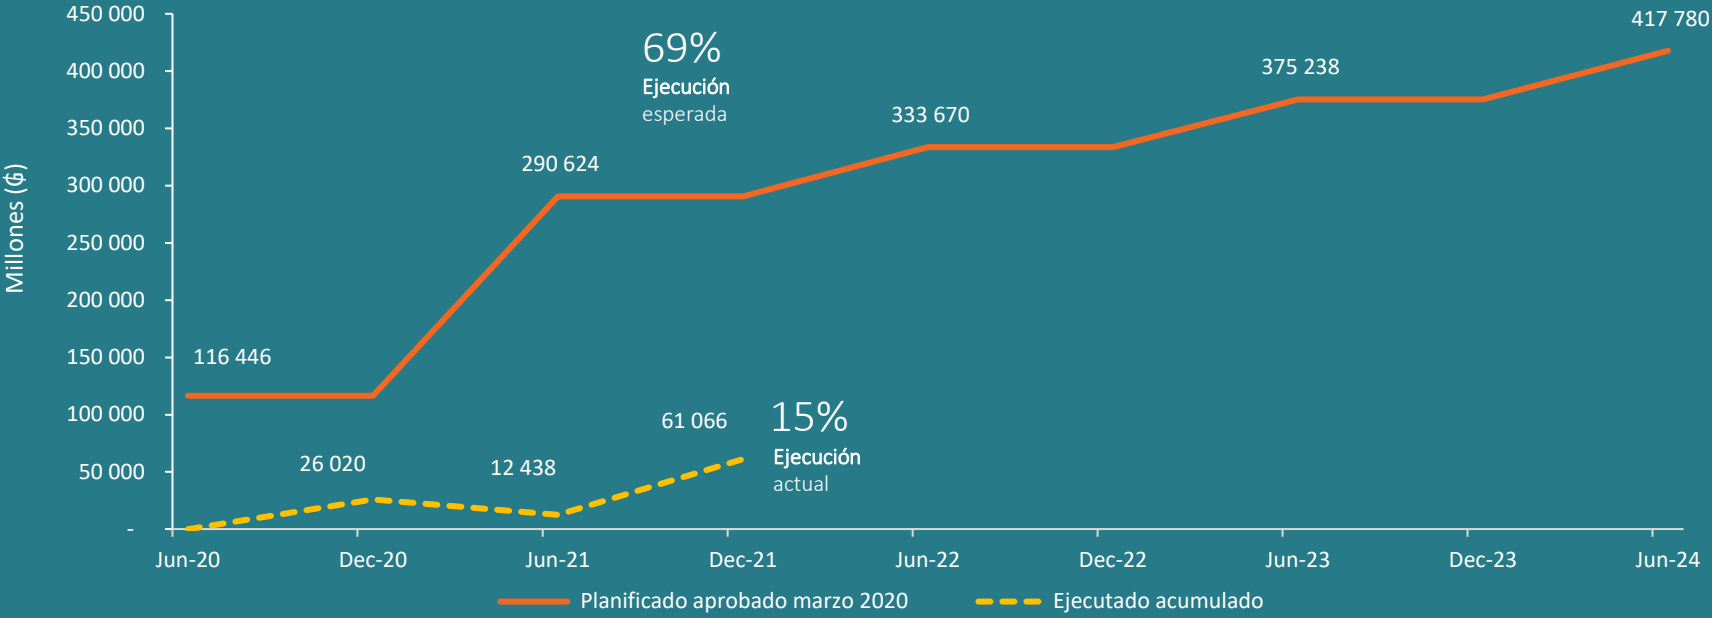


Establecimientos con infraestructura interna (Celex y Excelsis)

Productos claves



Tiempo restante para la meta
290 días

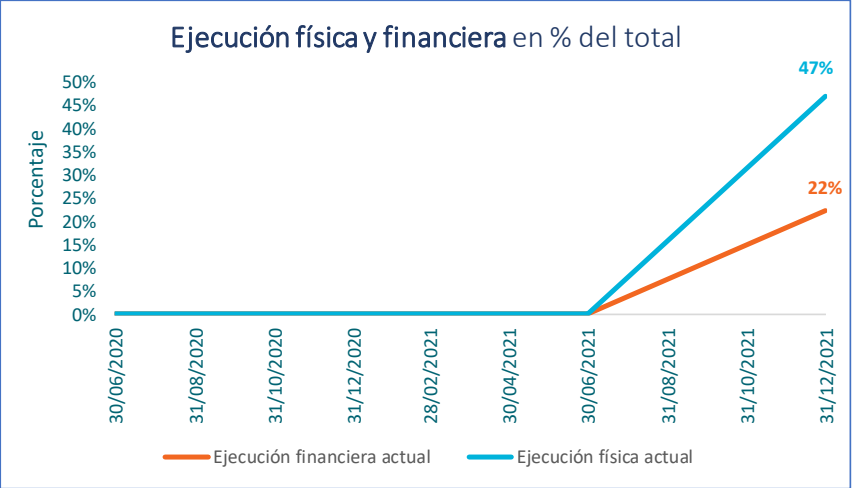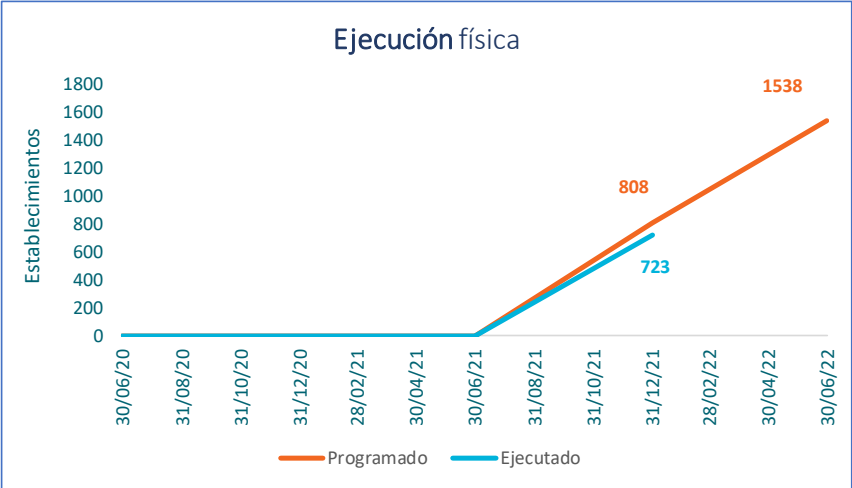

Meta programada a junio de 2022
Establecimientos

1.538

Meta alcanzada a diciembre de 2021
Establecimientos

723

Ejecución

47%

Recursos financieros asignados
millones de ₡

18.401

Recursos ejecutados a diciembre de 2021
millones de ₡

4.121



Ejecución

22%

Equipos para establecimientos educativos (Última milla, acuerdo con COPACO)



Tiempo restante para la meta
290 días

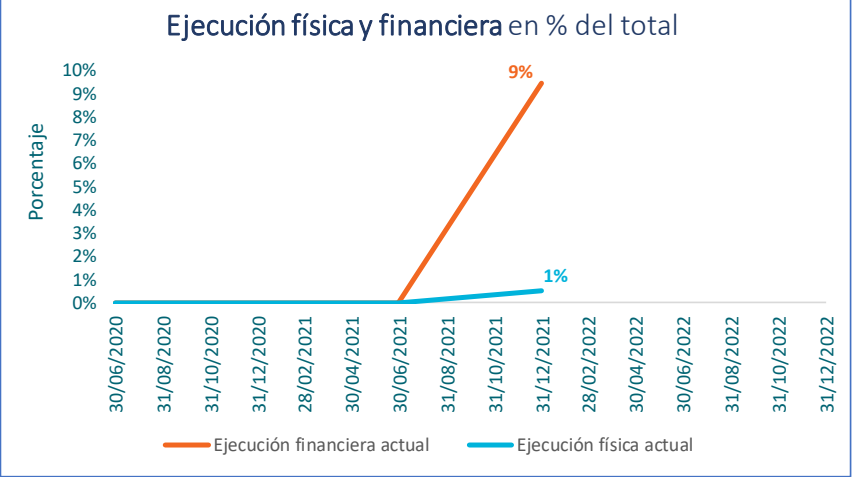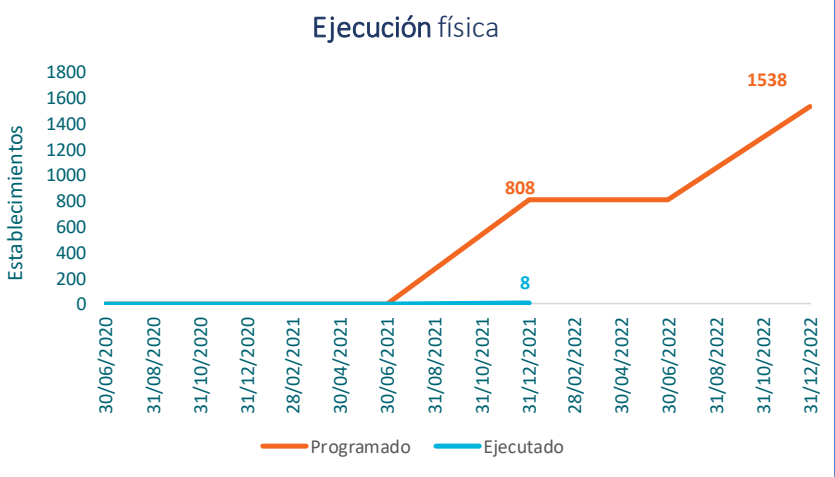

Meta programada a junio de 2022
Establecimientos

1.538

Meta alcanzada a diciembre de 2021
Establecimientos

8

Ejecución

1%

Recursos financieros asignados
millones de ₡

65.639

Recursos ejecutados a diciembre de 2021
millones de ₡

6.200



Ejecución

9%

Establecimientos con internet (Acuerdo con COPACO)



Tiempo restante para la meta
290 días

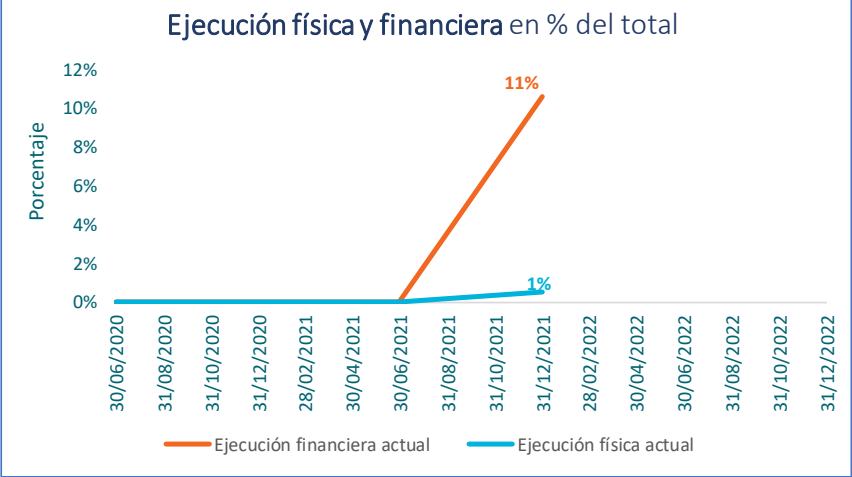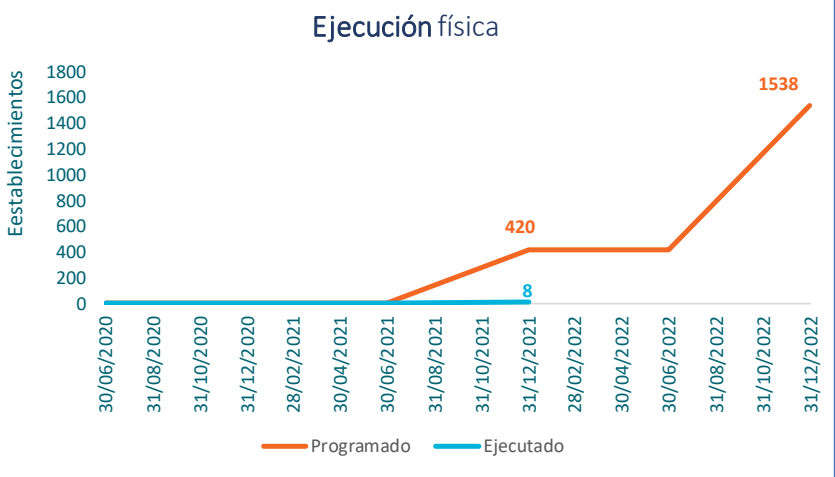

Meta programada a junio de 2022
Establecimientos

1.538

Meta alcanzada a diciembre de 2021
Establecimientos

8

Ejecución

1%

Recursos financieros asignados
millones de ₡

23.384

Recursos ejecutados a diciembre de 2021
millones de ₡

2.475

Ejecución

10%
