


## 7. PROYECTO DE “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE COLEGIOS TÉCNICOS DE EDUCACIÓN MEDIA DEL SECTOR OFICIAL, A NIVEL PAÍS” - PROMIE - MEC


Metas	Avances
Mejora edilicia de <b>151 bachilleratos técnicos con 633 espacios nuevos</b> , aulas, talleres, laboratorios, pista deportiva, vestuario, cocina-comedor, porqueriza, invernadero, entre otros, construidos	El servicio de relevamiento edilicio, diseño y fiscalización en obras inició en septiembre, <b>debería finalizar el 21 de febrero y entregaron 12 proyectos de 151 a entregar.</b>
<b>Equipamiento</b> y mobiliario según requerimiento de cada especialidad técnica, <b>para 151 instituciones</b>	

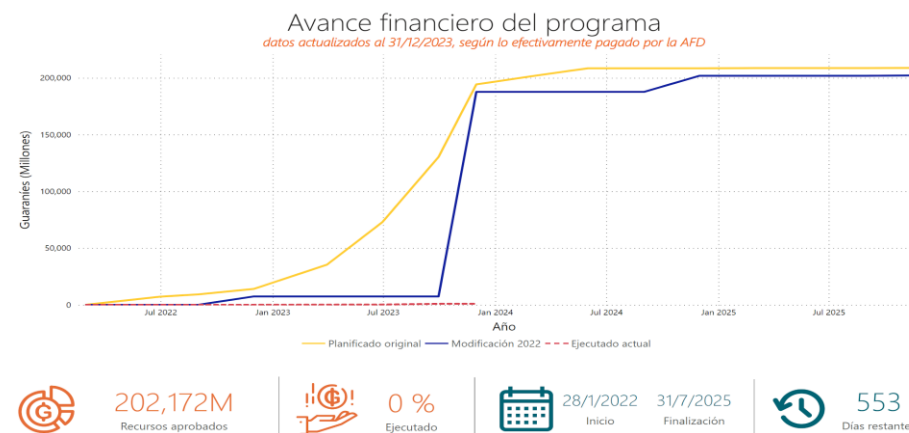

### PRINCIPALES CONSIDERACIONES

- El relevamiento edilicio, diseño y fiscalización en obras si bien inició, cuenta con significativo retraso porque los entregables no llegan aún al 10% y ya transcurre más del 60% del tiempo disponible. En general el proyecto tiene retrasos que requieren de una reprogramación.

Recursos aprobados, comprometidos y ejecutados al 31/12/2023 (en \$)



# PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE COLEGIOS TÉCNICOS DE EDUCACIÓN MEDIA DEL SECTOR OFICIAL, A NIVEL PAÍS - PROMIE


**OBJETIVO:** Invertir en la infraestructura de colegios técnicos de la educación media de gestión oficial, para mejorar las condiciones de aprendizaje que contribuyan a la calidad de la oferta.

## DATOS GENERALES


Periodo reportado	Desde: 01/01/2023	Hasta: 30/06/2023
Unidad ejecutora	Ministerio de Educación y Ciencias – MEC	
Recursos aprobados	₡ 202.172.259.397	
Fecha de inicio	28/01/2022	Fecha de finalización 31/7/2025 - Según Resolución CAFEI N.º 01/2022

## ESTADO DEL PROYECTO

**Gráfico 1: Recursos aprobados, comprometidos y ejecutados\* acumulados al 30/06/2023**

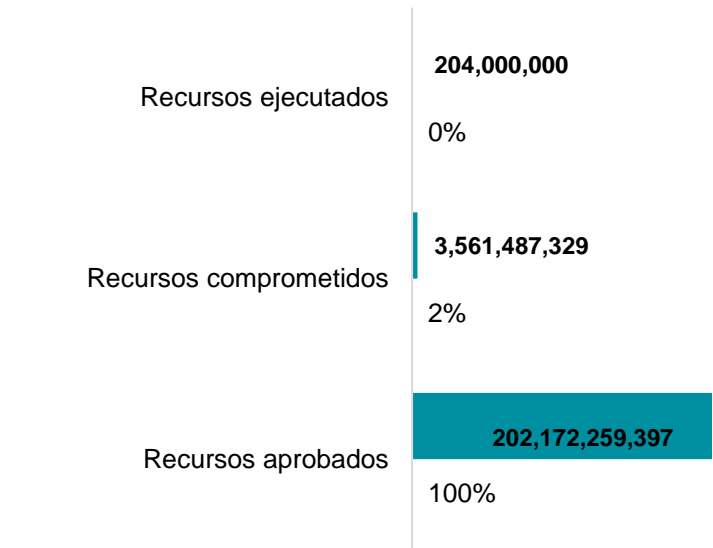

**Gráfico 2: Recursos aprobados y ejecutados acumulados al 30/06/2023 en ₡**

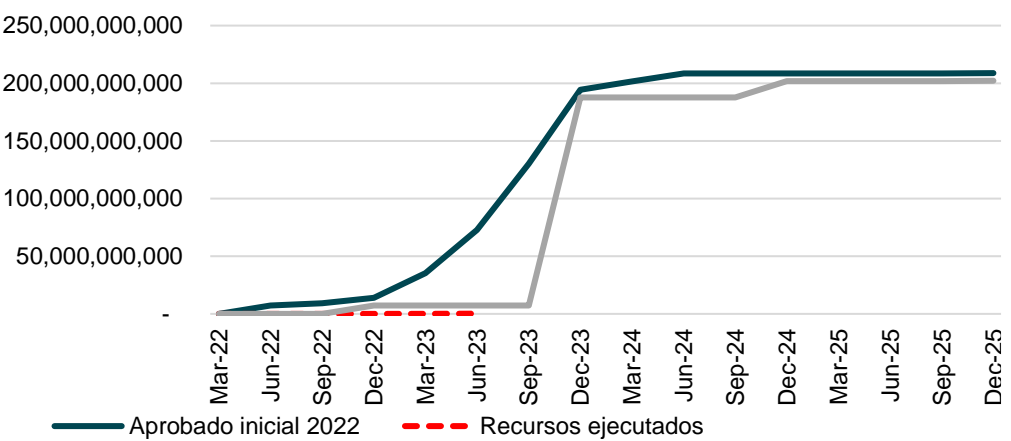

\*La ejecución registrada corresponde a lo efectivamente pagado por la Agencia Financiera de Desarrollo

**RESUMEN DE METAS FÍSICAS Y MONTOS EJECUTADOS\* POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES AL 30/06/2023 EN ¢**

EDT	COMPONENTES / PRODUCTOS	METAS DEL PROGRAMA	METAS ACUMULADAS PLANIFICADAS al 30/06/2023	METAS ACUMULADAS LOGRADAS al 30/06/2023	METAS LOGRADAS EN EL SEMESTRE	TOTAL APROBADO	MONTO COMPROMETIDO ACUMULADO (desde el inicio hasta 30/06/2023)	EJECUCIÓN ACUMULADA desde el inicio hasta 30/06/2023
	<b>TOTAL PROGRAMA/ PROYECTO</b>					<b>202.172.259.397</b>	<b>3.561.487.329</b>	<b>204.000.000</b>
<b>1</b>	<b>COMPONENTE 1 - Construcción y reparación de la infraestructura de los colegios técnicos bajo criterios de normas de seguridad y estándares de calidad</b>					<b>146.164.027.274</b>	<b>3.561.487.329</b>	<b>204.000.000</b>
<b>A.1</b>	<b>Relevamiento edilicio y proyecto ejecutivo de obras</b>	<b>151</b>				<b>3.561.487.328</b>	<b>3.561.487.329</b>	
A.1.1	Viáticos supervisión de proyecto/ entrega de sitio					18.487.328	18.487.329	
A.1.2	Consultoría de relevamiento edilicio y proyecto ejecutivo de obras.					3.322.000.000	3.322.000.000	
A.1.3	Equipo de gestión coordinación de proyectos de infraestructura- Supervisión de proyectos					221.000.000	221.000.000	204.000.000
<b>A.2</b>	<b>Construcción y reparación de obras - 151EE</b>	<b>151</b>				<b>133.855.272.486</b>	<b>-</b>	
A.2.1	Obras 151 locales					121.686.611.351		
A.2.2	Reparaciones (10% del costo de obras)					12.168.661.135		
<b>A.3</b>	<b>Supervisión de Obras</b>	<b>151</b>				<b>2.240.109.285</b>	<b>-</b>	
A.3.1	Viáticos					166.385.952		
A.3.2	Alquiler de vehiculos					1.263.390.000		
A.3.3	Equipo de gestión coordinación de proyectos de infraestructura- Supervisión de obras					810.333.333		

<b>A.4</b>	<b>Fiscalización de obras</b>	<b>151</b>				<b>6.507.158.175</b>	<b>-</b>	
A.4.1	Firma consultora de fiscalización para 151 EE					6.507.158.175		
<b>2</b>	<b>COMPONENTE 2: Dotación de equipamiento y mobiliario según requerimiento de cada especialidad técnica.</b>					<b>54.000.403.036</b>		
<b>A.1</b>	<b>Adquisición de mobiliario, materiales, equipamiento e insumos.</b>	<b>151</b>				<b>54.000.403.036</b>	<b>-</b>	
A.1.1	Mobiliario de 151 EE					12.150.403.036		
A.1.2	Materiales, equipamiento e insumos (transferencia de gratuidad)					41.850.000.000		
<b>3</b>	<b>COMPONENTE 3: Evaluación, seguimiento y monitoreo</b>					<b>2.007.829.087</b>		
<b>A.1</b>	<b>Auditoría Financiera y de Gestión - 2022 a 025</b>	<b>4</b>				<b>669.276.362</b>		
<b>A.2</b>	<b>Auditoría Técnica de Obras 151 EE (30% muestreo)</b>					<b>1.338.552.725</b>		
<b>A.3</b>	<b>Transferencia al proyecto "Apoyo Operativo a la Gestión de Programas y Proyectos del MEC"</b>							
A.3.1	Gestión Equipo Transversal de la Coordinación de Infraestructura					-	-	
A.3.2	Gestión administrativa y logística					-	-	
<b>A.4</b>	<b>Transferencia monitoreo externo y rendición de cuentas del Fondo</b>	<b>1</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	

\*\*Monto modificado del proyecto- Resolución CAFFEI N° 08-29/04/2022- Transferencia al fondo de monitoreo externo y rendición de cuentas.

**PRINCIPALES CONSIDERACIONES**

- La adjudicación del llamado a consultoría para servicios de relevamiento edilicio y proyecto ejecutivo de obras se encuentra impugnado, a la espera de la decisión resolutive de la DNCP. Se reitera la solicitud realizada en el semestre pasado, ante esta situación, y es que el MEC debe contar con un plan de contingencia ante el retraso de más de un año en la ejecución del proyecto.
- Se reitera la recomendación implementar mejoras en la gestión integral de las obras, implementadas a través de la coordinación de proyectos de infraestructura en forma simultánea, a la luz de la experiencia y los aprendizajes, donde el desafío es la gobernanza y no la complejidad de las obras.
