


## 8. PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ENTORNOS DE APRENDIZAJE EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES E INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE DE GESTIÓN OFICIAL" - TAPE - MEC

Metas	Avances
<b>1.316 locales escolares</b> con mejoras en	Proyecto reformulado. Las obras
infraestructura y equipamiento	mayores se trasladan a una iniciativa
initaestructura y equipamiento	fuera del FEEI a cargo del MOPC con
216 octablesimientos con obras mayoros	crédito del Banco Mundial.
316 establecimientos con obras mayores	316 EE con relevamiento licitado en
relevados y diseñados	
4.000 - 4.11 1.1 1.1 1.1 1.1.	lotes, 3 adjudicados para 189
1.000 establecimientos con obras menores	establecimientos, el plazo finaliza el
ejecutadas	8 de mayo.
1.327 establecimientos escolares con	
mobiliario (BM) y materiales educativos (FEEI)	
Apropiación de la ciencia y la tecnología en el	
ámbito de la educación: desarrollo de	
capacidades, acompañamiento pedagógico a	
1.200 formadores.	
1.327 establecimientos con dispositivos para la	
gestión del SIGE fortalecido.	
Dotación de dispositivos tecnológicos a	
estudiantes de IFD	-
Readecuación estructural de IFD para su	
conversión a 6 CEFED	





399,310N Recursos aprobados



0 % Ejecutado 15

15/6/2023 14/6/2028 Inicio Finalización



1,602 Días restantes

### **PRINCIPALES CONSIDERACIONES**

- Con la modificación considerable en el alcance por actividades complementadas con apalancamiento del Banco Mundial, se dieron retrasos en el inicio.
- De las actividades desarrolladas, licitando el relevamiento para 316 obras, el 40% está con protesta.

Recursos aprobados, comprometidos y ejecutados al 31/12/2023 (en \$)

• Recursos ejecutados 0 %
• Recursos comprometidos 0 %

Recursos aprobados

399,310,003,153

100 %



## PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS ENTORNOS DE APRENDIZAJE EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES E INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE DE GESTIÓN OFICIAL

OBJETIVO: Contribuir a elevar la formación de capital humano en Paraguay

#### **DATOS GENERALES**

Periodo reportado	Desde: 01/01/2023	Hasta: 30/06/2023					
Unidad ejecutora	Ministerio de Educación y Ciencias – MEC						
Recursos aprobados							
Fecha de inicio	15/06/2023	Fecha de finalización	14/6/2028 - Según Resolución CAFEEI N.º 02/2023				

#### **ESTADO DEL PROYECTO**

Gráfico 1: Recursos aprobados, comprometidos y ejecutados\* acumulados al 30/06/2023


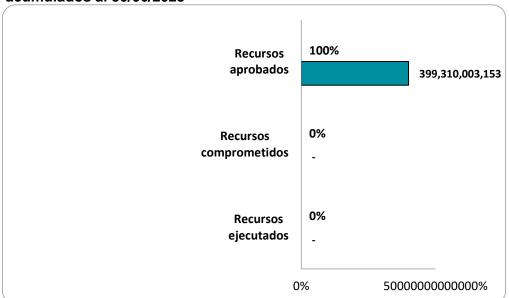


Gráfico 2: Recursos aprobados y ejecutados acumulados al 30/06/2023 en ₲



<sup>\*</sup>La ejecución registrada corresponde a lo efectivamente pagado por la Agencia Financiera de Desarrollo

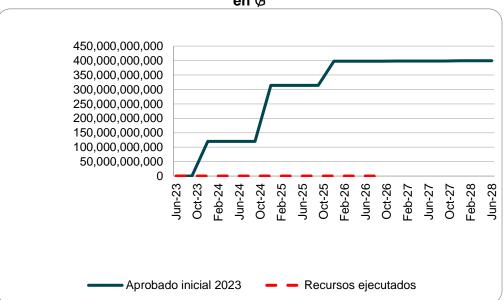

# RESUMEN DE METAS FÍSICAS Y MONTOS EJECUTADOS\* POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES AL 30/06/2023 EN &

COMPONENTES/ PRODUCTOS	METAS DEL PROGRAMA	METAS ACUMULADAS PLANIFICADAS al 30/06/2023	METAS ACUMULADAS LOGRADAS al 30/06/2023	METAS LOGRADAS EN EL SEMESTRE	TOTAL RECURSOS APROBADOS	MONTO COMPROMETIDO (*) ACUMULADO (desde el inicio hasta 30/06/2023)	EJECUCIÓN ACUMULADA desde el inicio hasta 30/06/2023
TOTAL, PROGRAMA PROYECTO					399.310.003.153		
C.1. Mejoramiento integral de los entornos de aprendizaje de LEAP seleccionados					202.210.003.152	-	-
1.1. Obras civiles mayores (300 LEAP y 16 CAI)	316	0	0	0	202.210.003.152	-	-
1.1.1. Relevamiento edilicio y proyecto ejecutivo de obras					12.280.000.000	-	-
1.1.2. Construcción y reparación de obras en 300 LEAP y 16 CAI					139.685.500.000	-	-
1.1.3. Viáticos supervisión de proyecto/entrega de sitio					1.780.451.136	-	-
1.1.4. Equipo de gestión coordinación de proyectos de infraestructura - Supervisión de proyectos					4.080.000.000	-	-
1.1.5. Combustible para supervisión de obras					1.998.752.000	-	-
1.1.6. Fiscalización de obras construidas y reparaciones en 316 locales escolares					42.385.300.016	-	-
1.2. Obras civiles menores (1.000 LEAP)	1.000	0	0	0	-	-	-
1.2.1. Construcciones de renovación y reparación (1.000)					-	-	-
1.2.2. Fiscalización de obras civiles menores							-
1.3 Mobiliario escolar y equipamiento de aprendizaje	1.316	0	0	0	-	-	-



1.3.1. Adquisición de muebles y equipos para locales escolares					_	_	-
1.4 Materiales educativos	1.316	0	0	0	_	_	-
1.4.1. Adquisición de materiales didácticos para locales escolares					-	-	-
C.2. Conectividad de establecimientos escolares y dotación de dispositivos digitales					189.800.000.001	-	-
2.1. Conectividad e infraestructura interna digital para conectividad					189.800.000.001	-	-
2.1.1. Infraestructura interna para conectividad	1.327				94.138.163.657	-	-
2.1.2. Dotación de dispositivos digitales	2.342				71.763.052.557	-	-
2.1.3. Conectividad de última milla	1.327				23.898.783.787	-	-
C.3. Readecuación estructural de IFD para su conversión a CEFED					_	-	-
3.1. Obras civiles 6 CEFED					_	-	-
3.1.1. Estudio de demanda y diseño para construcción de 3 CEFED	3				-	-	-
3.1.2. Obras civiles de 6 CEFED	6				_	-	-
3.1.3. Mobiliarios y equipamientos	6				_	_	1
3.1.4. Materiales educativos	6				-	-	-
3.1.5. Viáticos supervisión de proyecto/entrega de sitio					-	-	-
3.1.6. Equipo de gestión coordinación de proyectos de infraestructura-Supervisión de proyectos	6				-	-	-
3.1.7. Combustible para supervisión de obras					_	-	-
3.1.8. Fiscalización de obras	6					_	-



C.4.Gestión y monitoreo del proyecto			7.300.000.000	_	-
4.1 Gestión y monitoreo del proyecto			7.300.000.000		-
4.1.1. Recursos humanos UEPP			5.300.000.000	-	-
4.1.2. Adquisiciones de equipos MEC			-	-	-
4.1.3. Adquisición de vehículos para UEPP			_	-	-
4.1.4. Auditoría externa			-	-	-
4.1.5. Comunicación			-	-	-
4.1.6. Gastos operativos UEPP			-	-	-
4.1.7. Monitoreo y rendición de cuentas FEEI			2.000.000.000	-	-

## **PRINCIPALES CONSIDERACIONES**

• El proyecto, con apalancamiento del Banco Mundial, fue aprobado por el FEEI en marzo del presente año. La fecha de inicio es el 15 de junio por cuanto aún no se reportan avances.
